
WBS

Smartsheet 도움말 ➜


갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.

프로젝트 이름	근거 기반 고객 피드백·응대 에이전트 (가칭) [1]	**회사명**	SKN AI 33기 5팀_안녕하세요오팀입니다잘부탁드립니
프로젝트 관리자	미정 — 10/06 역할 합의 [3]	**날짜**	26년 10월 5일 [4]


WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율
1	**기획·멘토링·범위 설계 [17]**	**배정 전**	**26년 10월 5일**	**26년 10월 8일**	**4 [18]**	
1.1	공통 요구사항·WBS 팀 검토 및 1차 제출 [T01] [19]	미정	26년 10월 5일	26년 10월 5일	1	[20]
1.2	기존 Agent 플랫폼 하나의 E2E 체험·사용 소감 [T02] [21]	미정	26년 10월 5일	26년 10월 6일	2	[22]
1.3	접근·인터뷰 가능성 확인 및 우선 Use Case 구체화 [T03] [23]	미정	26년 10월 5일	26년 10월 6일	2	[24]
1.4	기존 플랫폼 실행·실패 재현 기록 [T27] [25]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 6일	1	[26]
1.5	멘토링 결과 검토·주제/사용자/핵심 범위 선정 [T04] [27]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 6일	1	[28]
1.6	요구사항 갱신·역할 배정·기획서 작성 [T05] [29]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 8일	3	[30]
1.7	샘플·근거 문서·이용조건 확인 및 수집 보고 [T06] [31]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 8일	3	[32]
1.8	접수·근거·초안·검토·이력 화면 설계 [T07] [33]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 8일	3	[34]
1.9	실패 근거 기반 핵심 기술 문제·개선 가설 선정 [T28] [35]	미정	26년 10월 6일	26년 10월 8일	3	[36]
2	**데이터·학습·검색·기준선 [37]**	**배정 전**	**26년 10월 12일**	**26년 10월 23일**	**12 [38]**	
2.1	DB 관계·문서 저장·실행/검토 이력 설계 [T08] [39]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[40]
2.2	데이터 정제·문서 분할·품질 검수·평가셋 분리 [T09] [41]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[42]

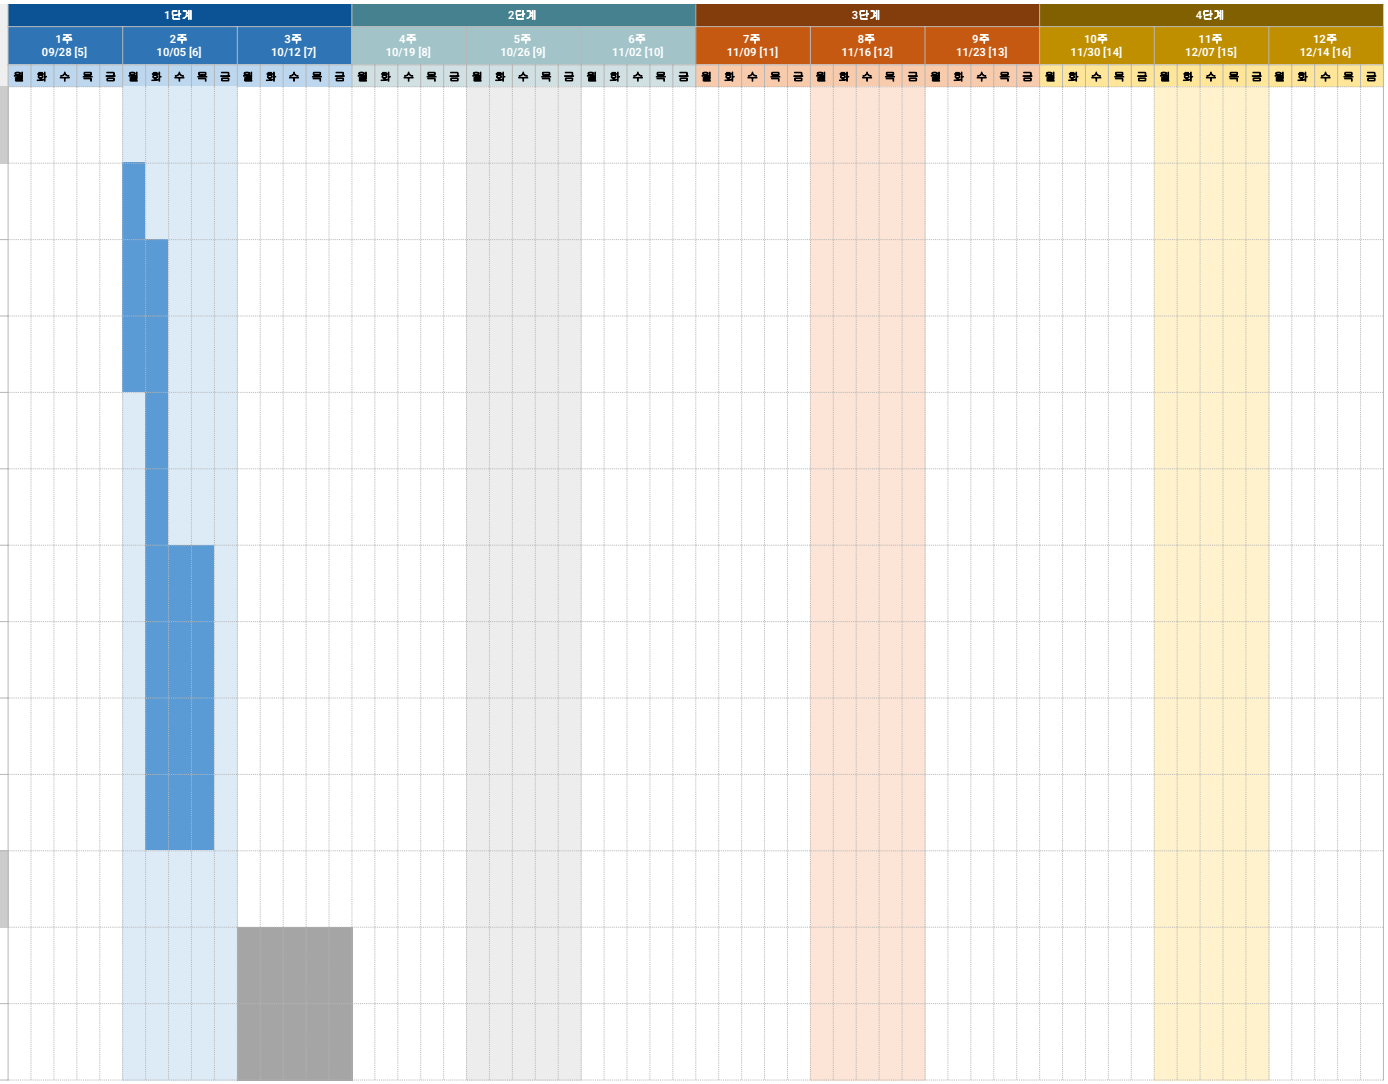

2.3	중간 PT 제출 자료·확인 현황·계획 정리 [T10] [43]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[44]
2.4	평가셋·라벨 지침·채점·종료 상태 기준 확정 [T29] [45]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[46]
2.5	실행·토큰·시간·API/GPU 비용 로그 스키마 설계 [T30] [47]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[48]
2.6	에이전트 인터페이스·상태·분기 설계 중간 합의 [T34] [49]	미정	26년 10월 12일	26년 10월 16일	5	[50]
2.7	문의 분류 등 학습 기준선·비교 평가·모델 저장 [T11] [51]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 23일	5	[52]
2.8	벡터DB/GraphDB 적용 결정·구축·근거 검색 평가 [T12] [53]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 23일	5	[54]
2.9	실행 로그 수집·토큰/시간·비용 집계 구현 [T31] [55]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 23일	5	[56]
2.10	기존/고정 실행의 품질·시간·비용 기준선 측정 [T32] [57]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 23일	5	[58]
3	**구현·통합·에이전트 검증 [59]**	**배정 전**	**26년 10월 19일**	**26년 11월 6일**	**19**	**[60]**
3.1	에이전트 역할·도구·상태·검증/실패 분기 설계 [T13] [61]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 30일	12	[62]
3.2	화면·접수/조회 API·담당자 검토·이력 구현 [T14] [63]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 30일	12	[64]
3.3	[조건부] 필요시 자체 sLLM 구성·학습/평가·적용 자료 [T16] [65]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 30일	12	[66]
3.4	[조건부] 채택 시 기업별 문서·정책·도구·흐름 설정 구현 [T38] [67]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 30일	12	[68]
3.5	[조건부] 채택 시 기업/역할 접근·테스트 실행·비용 조회 구현 [T39] [69]	미정	26년 10월 19일	26년 10월 30일	12	[70]
3.6	검색·초안·검증·정보 부족 분기 통합 구현 [T15] [71]	미정	26년 10월 26일	26년 10월 30일	5	[72]
3.7	배포 환경 구성·서비스/연결 상태 확인 [T35] [73]	미정	26년 10월 26일	26년 10월 30일	5	[74]

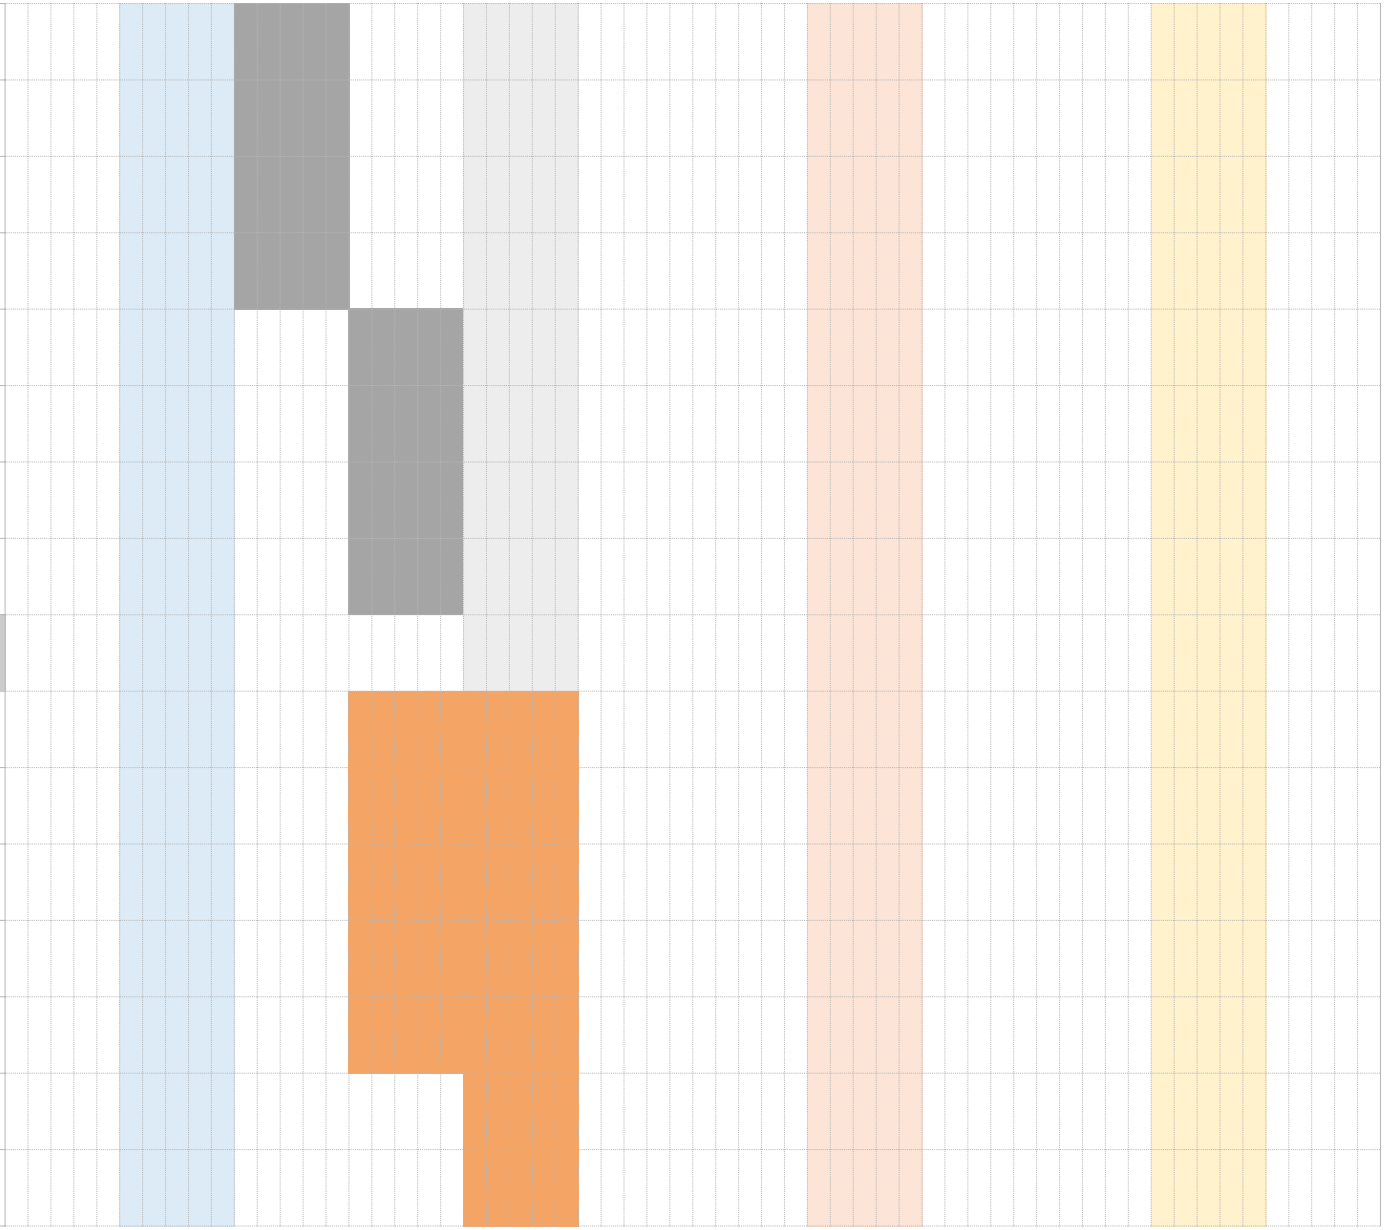

3.8	UI/API·모델·검색·저장소 연결 구성도 정리 [T17] [75]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[76]
3.9	정상·근거 없음·충돌·재시도·검토 분기 평가 [T18] [77]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[78]
3.10	웹 UI/API/LLM 연결 및 테스트용 빌드 준비 [T19] [79]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[80]
3.11	[핵심 범위 검토] 반복 문의·수정/보류 사유 집계 [T20] [81]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[82]
3.12	[조건부] 채택 시 모델·에이전트 선택 최적화 구현·평가 [T36] [83]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[84]
3.13	배포 장애·시간 초과·복구·이력 보존 검증 [T37] [85]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[86]
3.14	[조건부] 채택 시 설정 변경 전후·버전 추적·접근 분리 평가 [T40] [87]	미정	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5	[88]
4	**서비스 검증·최종 제출 [89]**	**배정 전**	**26년 11월 9일**	**26년 11월 20일**	**12**	**[90]**
4.1	사용자 시나리오·오류·응답시간·비용·결함 평가 [T21] [91]	미정	26년 11월 9일	26년 11월 13일	5	[92]
4.2	개선 전후 동일 조건 품질·시간·비용 비교 [T33] [93]	미정	26년 11월 9일	26년 11월 13일	5	[94]
4.3	테스트 결함 수정·안정화·최종 웹앱 확인 [T22] [95]	미정	26년 11월 16일	26년 11월 18일	3	[96]
4.4	최종 PT 제출 자료·근거 정리·발표 연습 [T23] [97]	미정	26년 11월 16일	26년 11월 20일	5	[98]
4.5	최종 소스·README·실행/재현 안내·버전 정리 [T24] [99]	미정	26년 11월 19일	26년 11월 20일	2	[100]
4.6	대표 정상/예외/검토 흐름 녹화·영상 확인 [T25] [101]	미정	26년 11월 19일	26년 11월 20일	2	[102]
4.7	웹앱·발표·소스·시연영상 최종 체크·제출 [T26] [103]	미정	26년 11월 20일	26년 11월 20일	1	[104]

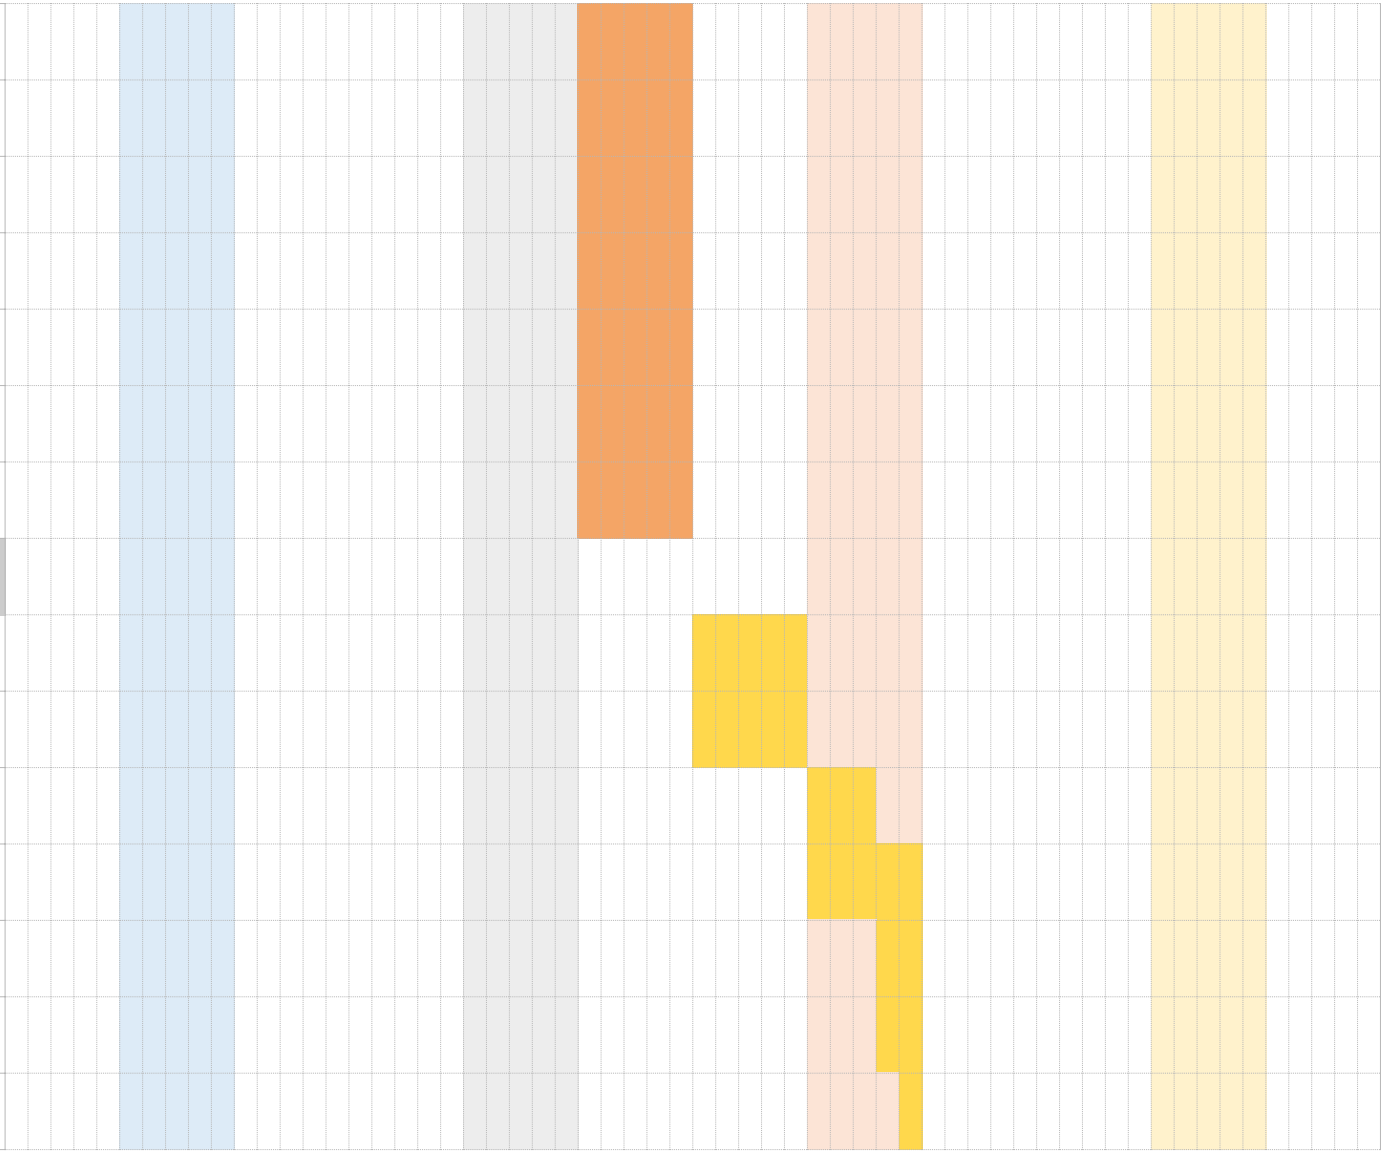

[1] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[2] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[3] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[4] 작성일; 일정 기준일은 2026-09-28

[5] 주 시작일 2026-09-28 / 월~금 표시

[6] 주 시작일 2026-10-05 / 월~금 표시

[7] 주 시작일 2026-10-12 / 월~금 표시

[8] 주 시작일 2026-10-19 / 월~금 표시

[9] 주 시작일 2026-10-26 / 월~금 표시

[10] 주 시작일 2026-11-02 / 월~금 표시

[11] 주 시작일 2026-11-09 / 월~금 표시

[12] 주 시작일 2026-11-16 / 월~금 표시

[13] 주 시작일 2026-11-23 / 월~금 표시

[14] 주 시작일 2026-11-30 / 월~금 표시

[15] 주 시작일 2026-12-07 / 월~금 표시

[16] 주 시작일 2026-12-14 / 월~금 표시

[17] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[18] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 단계 요약

[19] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T01
담당 역할 제안: 기획/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: -
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D01,D02 / 공식 마감: D01:10/02; D02:10/02
내부 목표: 2026-10-05 ~ 2026-10-05
연결 요구사항: FR-01~11,NFR-01~06
완료 기준: 공통/조건부 범위·원래 마감/팀 목표를 검토하고 의견·제출 여부를 기록
완료 증거: 검토 체크리스트·의견·제출/접수 증빙
결정/확인: 공식 마감 변경 및 제출 완료는 확인 전
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[20] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[21] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T02
담당 역할 제안: 체험 담당(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 멘토링 과제
선행 작업: -
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: 멘토링 / 공식 마감: 멘토링 10/6
내부 목표: 2026-10-05 ~ 2026-10-06
연결 요구사항: NFR-02,NFR-03
완료 기준: 하나의 플랫폼에서 문서·필요 도구·결과까지 실제 E2E 실행, 단계·실패 위치·사용 소감 기록
완료 증거: 실행 화면/로그·연결 설정·사용 소감
결정/확인: 실제 제품 하나 체험; 최종 기술 선택과 별도
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[22] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[23] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T03
담당 역할 제안: 기획/현업 접점(배정 전) / 실명 미배정

진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 멘토링 과제
선행 작업: -
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: 멘토링 / 공식 마감: 멘토링 10/6
내부 목표: 2026-10-05 ~ 2026-10-06
연결 요구사항: NFR-05
완료 기준: 제품/인터뷰 접근, 사용자·기존 흐름·실패 근거·필요 데이터·검증 방법을 확인/미확인으로 구분
완료 증거: Use Case 카드·접근/인터뷰 기록·설문 원문 검토 상태
결정/확인: 설문 전달 보고와 심층 인터뷰/실패 검증 구분
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[24] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[25] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T27
담당 역할 제안: 체험/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 멘토링 연계
선행 작업: T02
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D03 / 공식 마감: D03:10/08
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-06
연결 요구사항: NFR-02,NFR-03,NFR-05
완료 기준: 입력·문서/도구 상태·설정·기대/실제 결과·로그·재현 절차를 저장하고 소감과 기술 실패 구분
완료 증거: 재현 카드·실행/설정 스냅샷·실패 로그
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[26] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[27] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T04
담당 역할 제안: 전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안

선행 작업: T02,T03,T27
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D03 / 공식 마감: D03:10/08
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-06
연결 요구사항: 공통 범위
완료 기준: T02 체험·T03 현업 근거·T27 실패 기록을 보고 방향·첫 업무·기술 가설의 결정/보류 이유 기록
완료 증거: 회의 결정표·선정 근거·보류 목록
결정/확인: 서비스형/플랫폼형·고객 피드백 범위·최적화 채택 결정 전
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[28] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[29] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T05
담당 역할 제안: 기획/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T04
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D01,D02,D03 / 공식 마감: D01:10/02(갱신); D02:10/02(갱신); D03:10/08
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-08
연결 요구사항: FR-01~11,NFR-01~06,PLT-01~06,OPT-01
완료 기준: D01/D02를 갱신하고 기획서에 방향·핵심 피드백 분석·가설·조건부 범위·역할 합의 상태 연결
완료 증거: 요구사항/WBS 변경 이력·기획서·역할표
결정/확인: 기본/핵심 검토안과 미채택 조건부 후보를 구분해 갱신
비고: D01/D02는 원래 10/2 마감 문서의 갱신본; 10/8 기획서와 함께 내부 갱신
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[30] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[31] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T06
담당 역할 제안: 데이터(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T04
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음

연결 산출물: D04 / 공식 마감: D04:10/08
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-08
연결 요구사항: FR-03, NFR-01/05
완료 기준: 표본·필수 필드·원문 위치·문의/문서 연결·이용조건·실제/합성·민감정보 확인; 미확인 항목 표기
완료 증거: 표본 목록·출처/이용조건·필드/연결 품질표·설문 원문 상태
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[32] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[33] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T07
담당 역할 제안: 프론트/기획(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T04
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D05 / 공식 마감: D05:10/08
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-08
연결 요구사항: FR-01/03/04/07/08
완료 기준: 정상·정보 부족·전달·수정/보류·이력/비용 화면 흐름과 요구사항 연결, 플랫폼 UI는 별도 후보
완료 증거: 화면 흐름·와이어프레임·시나리오/FR 매핑
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[34] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[35] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T28
담당 역할 제안: 기획/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T04
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D03,D01 / 공식 마감: D03:10/08; D01:10/02(갱신)
내부 목표: 2026-10-06 ~ 2026-10-08

연결 요구사항: FR-02,FR-05,FR-10,NFR-05
완료 기준: 실제 실패와 원인 가설·개선할 기능·통제 비교·채택/보류 이유를 연결
완료 증거: 문제/가설 결정표·실패 사례 링크·동일 조건 비교 계획
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[36] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[37] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[38] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 단계 요약

[39] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T08
담당 역할 제안: 백엔드/데이터(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T05,T06
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D06 / 공식 마감: D06:10/16
내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: FR-01/03/08
완료 기준: 사례·문서·실행·검증·수정/보류·비용의 키/관계/버전 설계와 샘플 저장·조회 확인
완료 증거: ERD·DDL/저장 명세·표본 조회·T30 로그 스키마 연결
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[40] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[41] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T09
담당 역할 제안: 데이터/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T06

병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D07 / 공식 마감: D07:10/16
내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: FR-02/03, NFR-05
완료 기준: 전처리 전후 건수/품질·규칙·원본 보존 및 실제/합성/파생 ID로 중복 없는 분할 확인
완료 증거: 전처리 스크립트·품질표·분할 목록·원본 중복 검사
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[42] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[43] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T10
담당 역할 제안: 전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T05,T06,T07
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D11 / 공식 마감: D11:10/16
내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: 공통 관리
완료 기준: 10/16 PT 제출 자료에 확인한 문제/데이터/설계와 미확인·미완료 결과 구분; 실제 발표일 확인 상태 표시
완료 증거: 중간 PT·확인/미확인 목록·제출 기록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 10/16은 PT 자료 제출 마감; 실제 발표 개최일은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[44] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[45] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T29
담당 역할 제안: 데이터/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T06,T28
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D07,D08,D15,D17 / 공식 마감: D07:10/16; D08:10/23; D15:11/06; D17:11/13

내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: FR-02,FR-05,FR-11,NFR-05
완료 기준: 사례별 정답 근거·행동·필수 확인·종료·성공 기준, 원본 단위 분리·라벨 검수 정의
완료 증거: 평가셋/라벨/채점 버전·분할 목록·검수 기록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[46] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[47] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T30
담당 역할 제안: 백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T05,T28
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D06 / 공식 마감: D06:10/16
내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: FR-08,NFR-04
완료 기준: 실행·단계·모델 버전·토큰/캐시·호출/재시도·시간·단가·GPU 구간/배분·종료 상태 필드 및 계산식 정의
완료 증거: 로그 스키마·제공자 사용량 정의·단가/배분 명세·예시 계산
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[48] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[49] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T34
담당 역할 제안: AI/백엔드(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T05,T06,T07,T28
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D12 / 공식 마감: D12:10/30
내부 목표: 2026-10-12 ~ 2026-10-16
연결 요구사항: FR-10,NFR-03

완료 기준: 역할 입력/출력·도구·책임·전달값·재처리·반복/종료 조건을 구현 가능한 계약으로 합의
완료 증거: 역할 계약·상태 전이표·합의 버전/미확정 목록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[50] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[51] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T11
담당 역할 제안: AI/데이터(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T09,T29
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D08,D09 / 공식 마감: D08:10/23; D09:10/23
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-23
연결 요구사항: FR-02,FR-11,NFR-05
완료 기준: 입력/라벨/사용처·확신 처리 명세, 원본 단위 분리·기준선 비교·오분류 분석·모델 재로딩·경로 연결 확인
완료 증거: 학습 설정·분할/라벨 버전·평가표·오분류 사례·재로딩/경로 테스트
결정/확인: 학습 라벨·모델·서비스 사용처·확신도 처리 합의 필요
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[52] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[53] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T12
담당 역할 제안: AI/데이터(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T08,T09,T29
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D10 / 공식 마감: D10:10/23
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-23
연결 요구사항: FR-03
완료 기준: 정답 근거와 연결한 검색 저장소 구축·문서 위치 추적·검색/도구 누락 평가 및 방식 선택 이유 기록
완료 증거: 색인/저장 구조·검색 평가·근거 원문 연결 사례

결정/확인: 벡터DB/GraphDB 방식 선정 전
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[54] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[55] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T31
담당 역할 제안: 백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T08,T30
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D13,D18 / 공식 마감: D13:10/30; D18:11/20
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-23
연결 요구사항: FR-08,NFR-04
완료 기준: 정상/실패/재시도의 실행·단계 로그와 비용을 누락/중복 없이 집계; 측정 불가 사유 기록
완료 증거: 수집 코드·대표 로그·API 추정/청구 분리·GPU 구간/배분 대조
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[56] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[57] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T32
담당 역할 제안: AI/평가(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T29,T30
병행·조건부 선행: T31 수집 구현과 병행. T30의 기록 명세로 기준선 원자료를 보존하고 T31 집계와 대조
연결 산출물: D08,D12,D17 / 공식 마감: D08:10/23; D12:10/30; D17:11/13
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-23
연결 요구사항: NFR-04,NFR-05
완료 기준: 같은 평가셋·채점·문서/도구 스냅샷에서 품질·종료·시간·사용량·비용을 기록
완료 증거: 기준선 설정/실행 로그·채점 결과·시간/비용 원자료
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안

우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[58] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[59] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[60] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 단계 요약

[61] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T13
담당 역할 제안: AI/백엔드(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T34
병행·조건부 선행: T34에서 10/16 인터페이스/상태 중간 합의; 아키텍처 최종 문서는 10/30
연결 산출물: D12 / 공식 마감: D12:10/30
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: FR-10,NFR-03
완료 기준: T34 중간 계약을 반영해 역할 입출력/도구/책임·상태 전이·재처리/종료 조건을 구현/문서와 대조
완료 증거: 버전된 역할 계약·상태 전이표·아키텍처·구현 대조
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[62] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[63] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T14
담당 역할 제안: 프론트/백엔드(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T07,T08
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D18 / 공식 마감: D18:11/20
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: FR-01,FR-07,FR-08
완료 기준: 접수/조회·수정/승인/보류·사유 기록·근거/버전·실행 로그 UI/API가 대표 입력으로 동작

완료 증거: API 명세·UI 실행·검토 결과/사유 저장·조회 테스트
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[64] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[65] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T16
담당 역할 제안: AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 채택 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 조건부 후보
선행 작업: T09
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D14 / 공식 마감: D14:10/30
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: FR-11,NFR-04,NFR-05
완료 기준: 채택 시 sLLM의 학습/추론·사용처·품질/시간/비용 평가와 재현 방법을 기존 방식과 비교
완료 증거: 적용 결정·학습/실행 설정·평가표·재현 로그
결정/확인: 자체 sLLM 필요 여부·학습/평가 범위 채택 전
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[66] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[67] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T38
담당 역할 제안: 백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 채택 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 조건부 후보
선행 작업: T05,T06,T34
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D13,D18 / 공식 마감: D13:10/30; D18:11/20
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: PLT-01,PLT-02,PLT-03
완료 기준: 설정 등록/버전/연결 상태·흐름 분기를 테스트하고 실행에 적용된 설정 추적
완료 증거: 설정 API/UI·버전 이력·연결 실패/정상 로그
결정/확인: 플랫폼형(B) 채택 시; 미채택 시 실행 제외

비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[68] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[69] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T39
담당 역할 제안: 프론트/백엔드(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 채택 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 조건부 후보
선행 작업: T08,T34
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D13,D18 / 공식 마감: D13:10/30; D18:11/20
내부 목표: 2026-10-19 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: PLT-04,PLT-05
완료 기준: 관리자/담당자·기업별 허용/거부 조합 검증 및 실행ID→단계/상태/비용 조회
완료 증거: 권한/분리 테스트·관리 화면·테스트 실행 로그
결정/확인: 플랫폼형(B) 채택 시; 미채택 시 실행 제외
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[70] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[71] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T15
담당 역할 제안: AI/백엔드(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T11,T12,T31,T34
병행·조건부 선행: T13 전체 완료를 기다리는 대신 T34의 인터페이스·상태·분기 합의를 사용
연결 산출물: D13 / 공식 마감: D13:10/30
내부 목표: 2026-10-26 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: FR-02,FR-03,FR-04,FR-05,FR-06,FR-08,FR-10,FR-11
완료 기준: T34 계약에 따라 정상·정보 부족·근거 충돌·낮은 확신·한도 초과가 기대 종료 상태로 끝나고 전달값/로그 일치
완료 증거: 대표 평가 사례 실행·상태/재시도 로그·계약 대조·프로토타입
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)

기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[72] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[73] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T35
담당 역할 제안: 백엔드/배포(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T08,T31
병행·조건부 선행: T15 프로토타입과 병행하여 10/30 연결 결과 수합
연결 산출물: D16,D18 / 공식 마감: D16:11/06; D18:11/20
내부 목표: 2026-10-26 ~ 2026-10-30
연결 요구사항: NFR-06,FR-08
완료 기준: 배포 설정·권한/환경·상태 확인·모델/검색/DB 연결·실행 이력 저장 경로 확인
완료 증거: 배포 구성/실행 안내·health/연결 로그·환경 버전
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[74] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[75] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T17
담당 역할 제안: 백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T13,T14,T15,T35
병행·조건부 선행: 확정 시 T37 장애/복구 결과를 수합
연결 산출물: D16 / 공식 마감: D16:11/06
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: NFR-02,NFR-06
완료 기준: 실제 배포 UI/API·검색·모델·로그/DB·상태 확인 경로를 구성도와 대조, 장애/복구 결과 참조
완료 증거: 환경/연결 구성도·배포 설정 버전·상태/복구 증빙
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[76] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[77] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T18
담당 역할 제안: AI/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T13,T15
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D15 / 공식 마감: D15:11/06
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: FR-02,FR-05,FR-06,FR-10,FR-11,NFR-03,NFR-05
완료 기준: 동일 평가 사례에서 각 역할 입출력·도구 누락·재시도/종료·검증·전달을 정답과 대조
완료 증거: 에이전트 테스트 계획/결과·주장 탐지/오통과·분기 로그
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[78] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[79] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T19
담당 역할 제안: 프론트/백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T14,T15,T35
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D18 / 공식 마감: D18:11/20
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: FR-01~08,FR-10
완료 기준: 테스트용 웹 빌드에서 접수→경로/근거→초안/검증→담당자 판단→이력/비용이 연결
완료 증거: 통합 빌드·실행 URL/환경·시나리오 로그·연동 결함
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[80] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[81] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T20
담당 역할 제안: 데이터/프론트(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 범위 합의 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 핵심 범위 검토안
선행 작업: T14,T15
병행·조건부 선행: FR-09 채택 시 T21 착수 전 완료
연결 산출물: D18 / 공식 마감: D18:11/20
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: FR-09
완료 기준: 채택 시 문의/불만·요구·수정/보류·전달 사유 집계에서 관련 사례/근거/결과로 연결; 테스트 범위 포함
완료 증거: 집계 정의·원본 대조·사례 연결 실행·FR-09 테스트 목록
결정/확인: 고객 피드백 분석 범위 합의 필요
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[82] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[83] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T36
담당 역할 제안: AI(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 채택 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 조건부 후보
선행 작업: T15,T31,T32
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D15,D17,D18 / 공식 마감: D15:11/06; D17:11/13; D18:11/20
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: OPT-01,NFR-04,NFR-05
완료 기준: 선택 사유·정책 버전 기록, 고정 실행 대비 동일 품질 기준 성공률·지연·성공 건당 비용 평가
완료 증거: 선택 로그·고정/적응 비교 설정·평가 결과
결정/확인: 적응형 실행·비용 최적화 채택 시; 미채택 시 실행 제외
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[84] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[85] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T37
담당 역할 제안: 백엔드/QA(배정 전) / 실명 미배정

진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T35,T15
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D16,D17 / 공식 마감: D16:11/06; D17:11/13
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: NFR-03,NFR-06
완료 기준: 서비스/도구 장애·시간 초과 후 기대 종료·복구·대표 요청 재실행·이력 보존 확인
완료 증거: 장애 재현·복구 로그·상태 확인·미해결 장애 목록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[86] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[87] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T40
담당 역할 제안: 전체 팀/QA(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 채택 대기 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 조건부 후보
선행 작업: T38,T39
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D15,D17 / 공식 마감: D15:11/06; D17:11/13
내부 목표: 2026-11-02 ~ 2026-11-06
연결 요구사항: PLT-01~06,NFR-04,NFR-05
완료 기준: 같은 평가셋으로 설정 전후 비교·접근 분리·버전 추적·되돌리기를 검증
완료 증거: 설정/평가 버전·전후 품질/시간/비용표·권한/되돌리기 결과
결정/확인: 플랫폼형(B) 채택 시; 미채택 시 실행 제외
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 미정 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[88] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[89] 2026-10-05 작성 / 팀 합의 전 검토안. 주제는 10/06 합의 예정. 실제 담당·진행 상태·완료율은 미확인. 역할/일정/우선순위는 제안. 공식 산출물 마감과 내부 목표는 구분. 간트는 09/28부터 12주(월~금 표시), 기간은 시작·마감 포함 달력일; 공휴일 차감 없음. 실제 발표일은 미확인.

[90] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 단계 요약

[91] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T21
담당 역할 제안: 전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T17,T18,T19,T37
병행·조건부 선행: FR-09 채택 시 T20 선행. 플랫폼 채택 시 T40, 최적화 채택 시 T36 선행. T33은 병렬 수행 후 종료 시점 결과 수합
연결 산출물: D17 / 공식 마감: D17:11/13
내부 목표: 2026-11-09 ~ 2026-11-13
연결 요구사항: FR-01~11,NFR-01~06
완료 기준: 동일 평가셋의 사실/행동/종료 품질·표현/사실 수정·지연·추정 비용·전달·미해결 결함 기록; T33 비교 결과 수합
완료 증거: 버전된 평가셋/채점·서비스 테스트 보고·지연/비용표·결함 목록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[92] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[93] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T33
담당 역할 제안: AI/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T32,T18,T19
병행·조건부 선행: FR-09 채택 시 T20, OPT-01 채택 시 T36, 플랫폼 채택 시 T40 결과 포함
연결 산출물: D17,D19 / 공식 마감: D17:11/13; D19:11/20
내부 목표: 2026-11-09 ~ 2026-11-13
연결 요구사항: FR-05,NFR-04,NFR-05
완료 기준: 변경 변수·동일 평가조건·자동처리/전달/실패·표현/사실 수정·성공 건당 비용·미해결 결함 비교
완료 증거: 전후 비교표·원시 실행/채점 로그·결함 목록
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 추가 작업의 내부 일정은 팀 검토용 제안
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[94] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[95] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T22
담당 역할 제안: 프론트/백엔드/AI(배정 전) / 실명 미배정

진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T21
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D18 / 공식 마감: D18:11/20
내부 목표: 2026-11-16 ~ 2026-11-18
연결 요구사항: FR-01~11,NFR-03,NFR-06
완료 기준: 결함 재검증·회귀·서비스 상태·근거/로그 보존을 확인하고 11/18 내부 안정화 상태 기록
완료 증거: 수정/재검증 결과·회귀 로그·배포 버전·잔여 결함
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[96] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[97] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T23
담당 역할 제안: 전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T21
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D19 / 공식 마감: D19:11/20
내부 목표: 2026-11-16 ~ 2026-11-20
연결 요구사항: 공통 관리
완료 기준: 최종 PT 제출 자료가 검증 근거·구현·비교 조건·품질/비용·한계와 일치; 실제 발표일은 별도
완료 증거: 최종 PT·근거 매핑·연습 기록·발표일 확인 상태
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 11/20은 PT 자료 제출 마감; 실제 발표 개최일은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[98] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[99] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T24
담당 역할 제안: 백엔드/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안

선행 작업: T22
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D20 / 공식 마감: D20:11/20
내부 목표: 2026-11-19 ~ 2026-11-20
연결 요구사항: NFR-02
완료 기준: 클린 환경에서 안내대로 설치/실행·대표 요청·평가 재현, 필요한 설정·라이선스·버전 확인
완료 증거: 저장소 태그·README·실행/평가 재현 로그
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[100] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[101] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T25
담당 역할 제안: 시연/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T22
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음
연결 산출물: D21 / 공식 마감: D21:11/20
내부 목표: 2026-11-19 ~ 2026-11-20
연결 요구사항: FR-01~08
완료 기준: 정상·예외 전달·담당자 검토·근거/이력 화면을 포함해 영상 재생 및 민감정보 노출 확인
완료 증거: MP4·시나리오 목록·재생/노출 체크
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 중간 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[102] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.

[103] 기존 요구사항/WBS 연결 ID: T26
담당 역할 제안: 팀 대표/전체 팀(배정 전) / 실명 미배정
진행 상태: 미확인 / 실제 착수·완료·진행률 미확인
적용/채택: 기본 검토안
선행 작업: T23,T24,T25
병행·조건부 선행: 별도 조건 없음

연결 산출물: D18,D19,D20,D21 / 공식 마감: D18:11/20; D19:11/20; D20:11/20; D21:11/20
내부 목표: 2026-11-20 ~ 2026-11-20
연결 요구사항: 공통 관리
완료 기준: D18~21 파일/실행 접근·버전·영상 재생·제출/접수 여부를 항목별 확인
완료 증거: 최종 제출 체크리스트·접수/접근 증빙
결정/확인: 팀 범위·역할·상세 일정 합의 후 확정
비고: 계획 제안이며 실제 완료/제출 증빙은 별도 확인
우선순위: 높음 (팀 합의 전 제안; 조건부 범위는 미정)
기간 기준: 시작·마감일 포함 달력일. 간트는 월~금 표시하며 공휴일 차감 없음.

[104] 실제 완료율 미확인; 확인 후 0~100% 숫자로 입력. 담당자·착수/완료 여부는 작업 제목의 메모 참조.
